LANGIT MEMBANGUN INDONESIA

ERP LMI · PANDUAN PENGGUNA

Panduan Teknik & Matrix

Mencatat progres pembangunan, LOT, dan subcon setiap unit, lalu membaca laporan Matrix mingguan: Mikro, Makro, Non Lot, dan Akad.

Isi panduan

1 Dua sumber data progres

2 Dashboard Teknik

3 Data Rumah

4 Memperbarui progres satu unit

5 Mengubah beberapa unit sekaligus

6 Laporan Matrix

7 Empat tab laporan

8 Unggah Matrix

9 Tanya jawab

Bagian yang perlu dibaca

PERAN	BAGIAN
Admin Teknik	1–5, 9
Project Manager, Direktur	1, 3 (melihat progres dan riwayatnya), 6, 7
Admin KPR, Admin Sales, FAT (Keuangan)	1, 6, 7
Admin Sistem	8


Versi 12 November 2026 · PT Langit Membangun Indonesia

Panduan ini bisa dibuka kapan saja dari menu **Panduan** atau tombol **Panduan** di halaman Teknik dan Matrix.

BAGIAN 1

Dua sumber data progres

Progres pembangunan dicatat **Admin Teknik** di Data Rumah setiap ada kemajuan di lapangan. Setiap minggu Admin KPR juga menyusun **berkas Matrix** yang memuat progres, tahap berkas KPR, dan uang muka per unit. Berkas itu diunggah Admin Sistem dan menjadi Laporan Matrix.

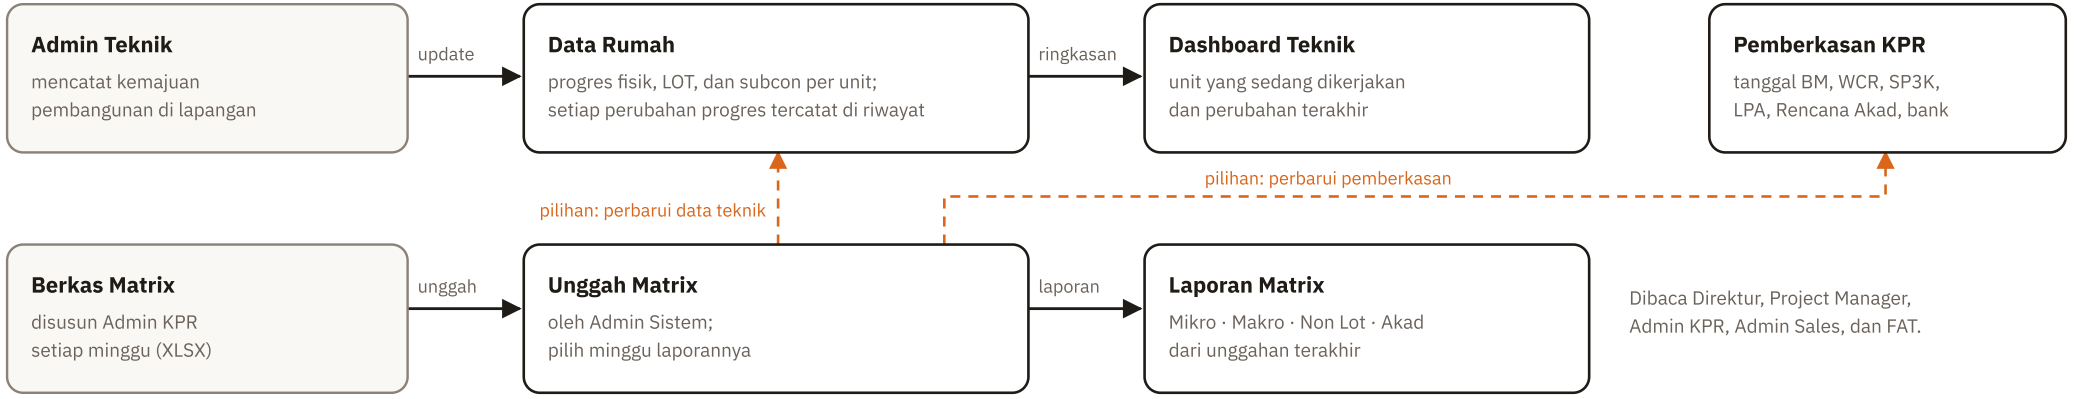

Garis putus-putus hanya berlaku bila Admin Sistem menyalakan pilihannya saat mengunggah (Bagian 8).

- Semua halaman menampilkan data **proyek aktif** di sidebar.
- **LOT** adalah nomor gelombang pembangunan. Unit yang belum punya LOT belum dijadwalkan dibangun.

- Admin Teknik memperbarui progres. Project Manager dan Direktur hanya melihat.
- Menu **Matrix** hanya muncul untuk peran yang membaca laporannya. **Unggah** hanya untuk Admin Sistem.


BAGIAN 2 · ADMIN TEKNIK

Dashboard Teknik

Halaman pertama setelah Admin Teknik masuk, juga dari menu **Dashboard**.

1. Ringkasan unit: **Total Unit**, **Sedang Dikerjakan** (progres 1–99%), dan **Selesai** (100%).
2. **Belum Dicatat**: unit yang progresnya masih 0%. Di bawahnya ada jumlah unit yang nomor LOT-nya masih kosong.
3. `Data Rumah` membuka daftar unit untuk diperbarui (Bagian 3).
4. **Sedang Dikerjakan**: unit yang sedang dibangun, progres terendah di atas. Di bawah nama unit tertulis tipe dan LOT-nya.
5. **Perubahan Terakhir**: progres dari berapa ke berapa, kapan, siapa yang mencatat, dan catatannya.

> Angka Belum Dicatat turun dengan sendirinya setiap ada unit yang progresnya diisi.

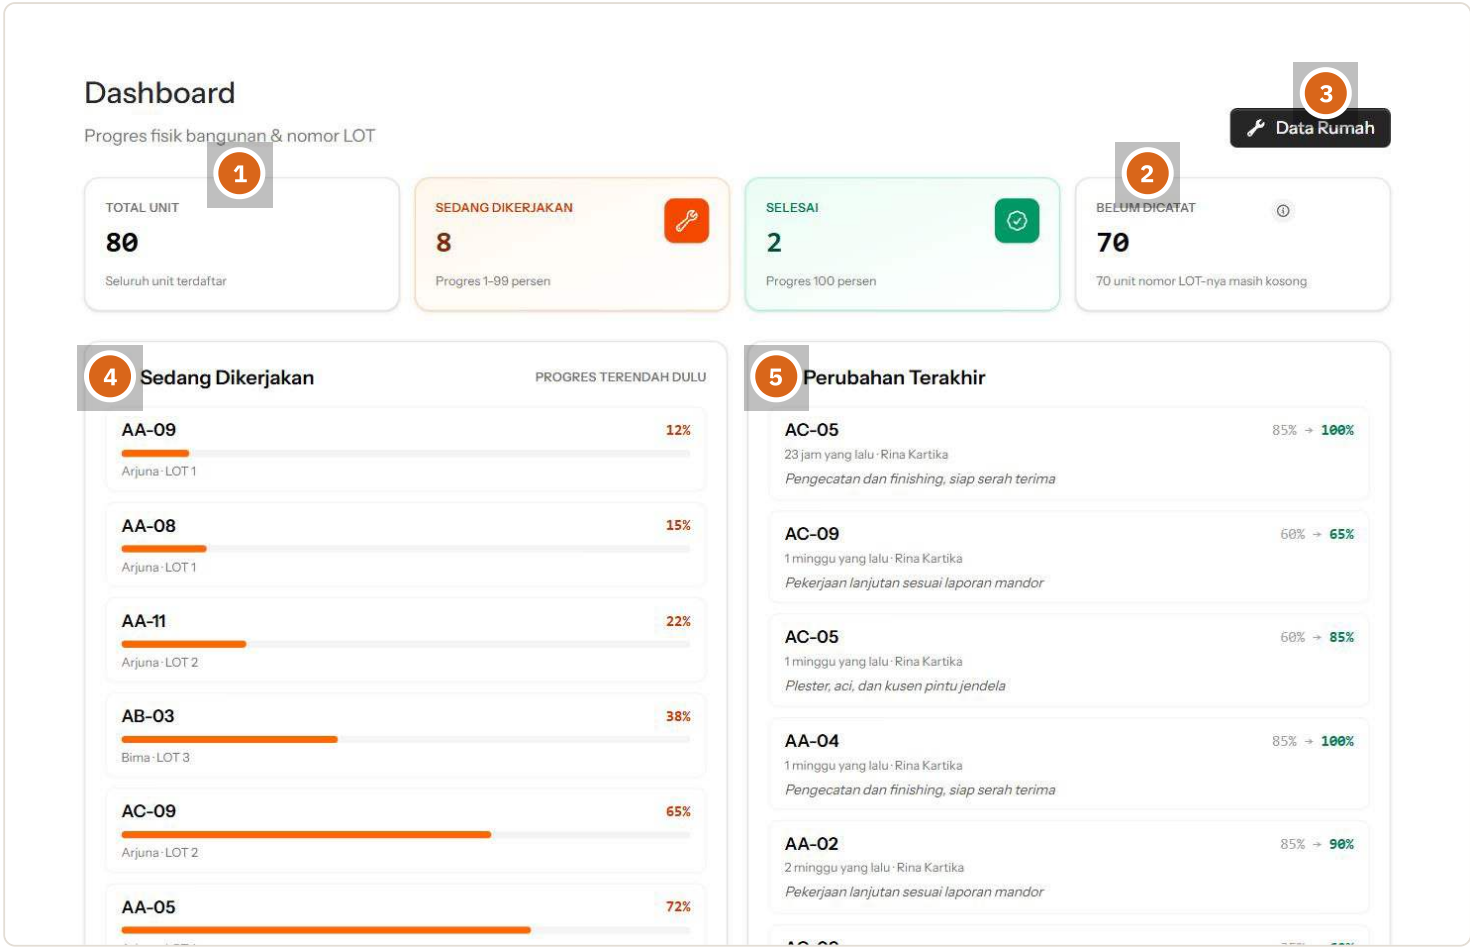

BAGIAN 3

Data Rumah


Menu **Teknik › Data Rumah**. Satu baris per unit.

1. **Filter Progres Fisik**: geser kedua titik untuk memilih rentang, atau klik pilihan cepat *Semua*, *Belum Mulai (0%)*, *Dalam Proses (1–99%)*, *Selesai (100%)*. Angka di tiap pilihan adalah jumlah unitnya.
2. Cari blok-unit, LOT, atau subcon. Di sebelahnya: saringan blok dan jumlah baris per halaman.
3. Centang unit untuk diubah bersama (Bagian 5).
4. **Update** progres, LOT, dan subcon satu unit (Bagian 4).
5. Ikon jam membuka **riwayat progres** unit itu.

Warna batang progres: 0% · di bawah 50% · 50–99% · 100%.

Update Terakhir berisi waktu dan nama yang terakhir mengubah data unit itu.

> Project Manager dan Direktur melihat halaman yang sama tanpa kotak centang dan tombol Update. Riwayat tetap bisa dibuka.

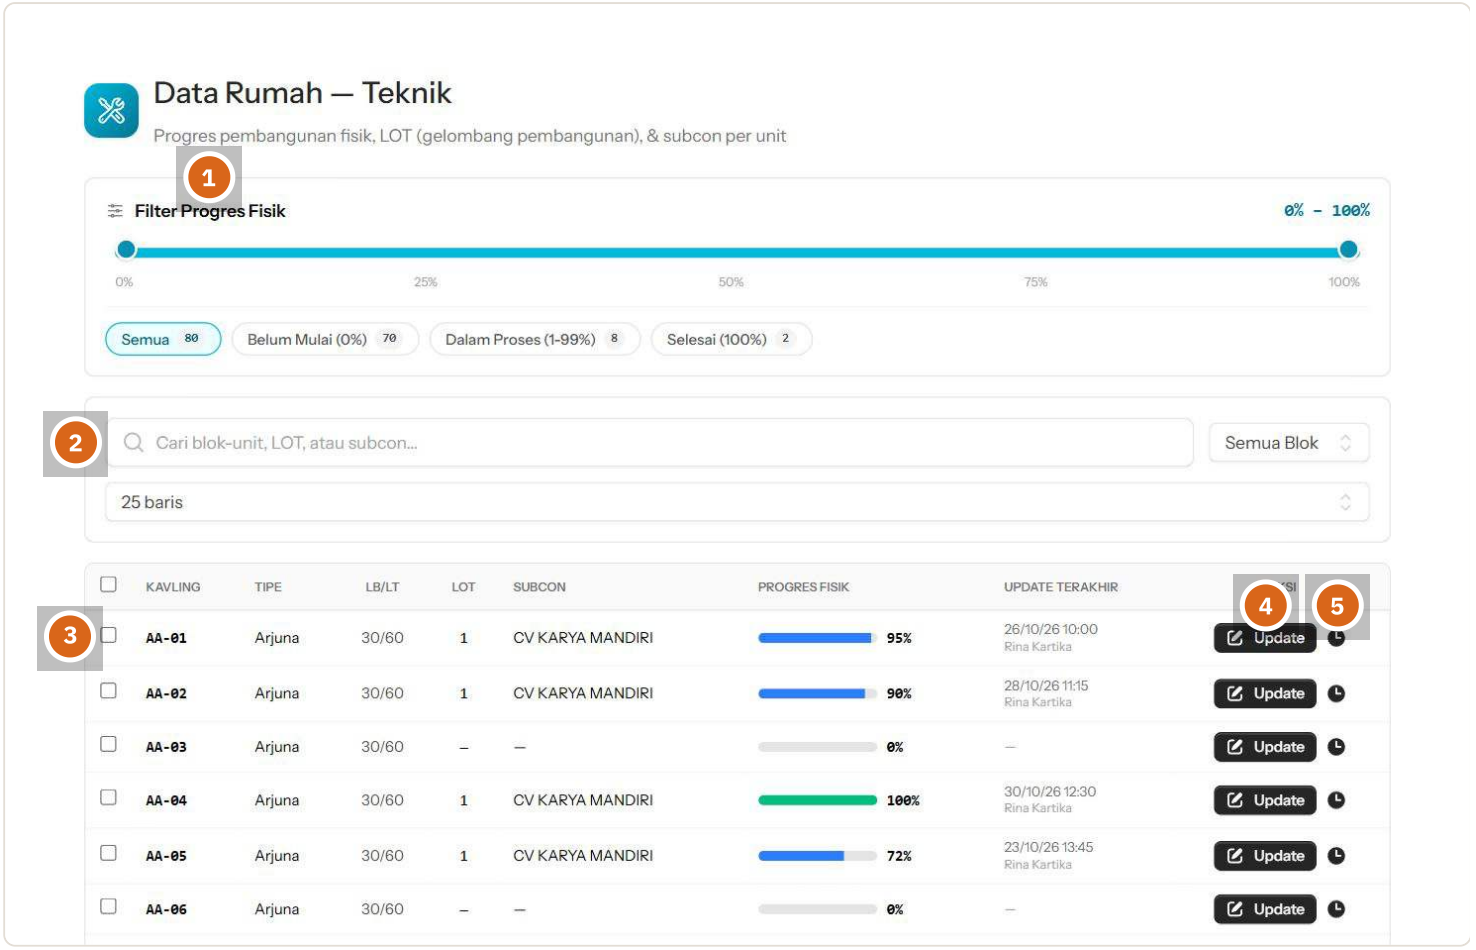

BAGIAN 4 · ADMIN TEKNIK


Memperbarui progres satu unit

Klik **Update** pada baris unit.

1. **Progres Fisik**: geser, ketik angkanya (0–100), atau klik 0% / 25% / 50% / 75% / 100%.
2. **LOT**: nomor gelombang pembangunan unit ini.
3. **Subcon**: pemborong yang mengerjakan unit ini.
4. **Catatan Perubahan**, misalnya *selesai pengecoran* atau *atap terpasang*.
5. **Simpan**.

Setiap kali progres berubah, sistem mencatat baris baru di **Riwayat Progres**: tanggal, dari berapa ke berapa persen, catatan, dan nama yang mengubah. Riwayat menampilkan 50 perubahan terakhir unit itu.

> Mengubah LOT atau subcon saja tidak menambah baris riwayat. Isi catatan setiap kali progres naik supaya riwayatnya bisa dibaca orang lain.

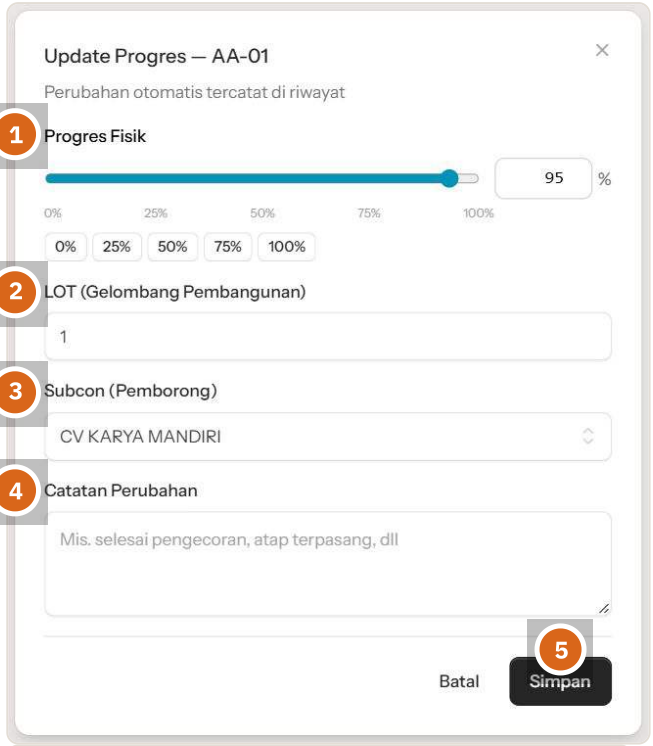




Mengubah beberapa unit sekaligus

Cocok untuk satu LOT yang dikerjakan subcon yang sama, atau beberapa unit yang mencapai tahap yang sama.

1. Centang unitnya di Data Rumah. Kotak di judul kolom mencentang semua unit di halaman itu. Jumlah yang dipilih tampil di bilah atas.
2. **Batalkan Pilihan** menghapus semua centang.
3. **Ubah Sekaligus** membuka isian di bawah.

Isi hanya yang ingin diubah: **Subcon**, **Progres Fisik**, **LOT**, dan catatan. Isian yang dibiarkan kosong tidak mengubah apa pun, jadi subcon bisa diganti tanpa menyentuh progres. Semua unit yang dipilih masuk ke LOT yang sama.

Untuk setiap unit yang progresnya berubah, catatan yang sama ditambahkan ke riwayatnya.

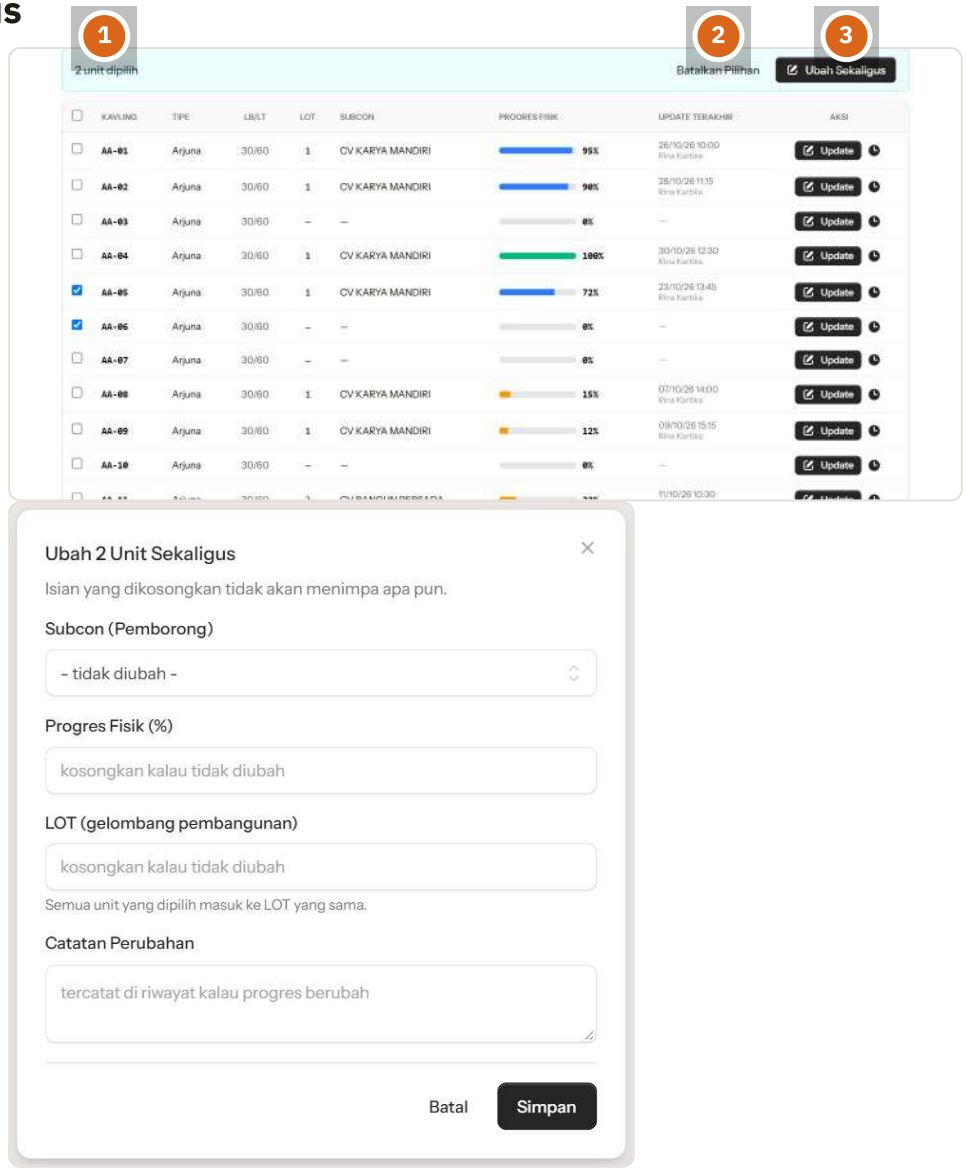


BAGIAN 6

Laporan Matrix

Menu **Matrix › Laporan**. Kanan atas: proyek, minggu laporan, nama berkas, dan kapan diunggah.

1. Tab **Mikro**, **Makro**, **Non Lot**, dan **Akad** (Bagian 7).
2. Kartu per tahap, misalnya *ACC SP3K* atau *Stock*. Klik kartunya untuk menampilkan unit di tahap itu saja; klik lagi atau klik **Jumlah** untuk kembali ke semua tahap.
3. Cari konsumen, unit, atau nama marketing. **Bersihkan** mengosongkan semua saringan.
4. **Prog min / maks**: rentang progres pembangunan. Kosongkan keduanya untuk melihat semua unit.
5. Saringan blok, tipe, dan tahap.
6. **Detail Unit**: klik judul kolom yang berpanah untuk mengurutkan. Geser ke kanan untuk kolom uang muka, BM, WCR, SP3K, LPA, dan rencana akad.

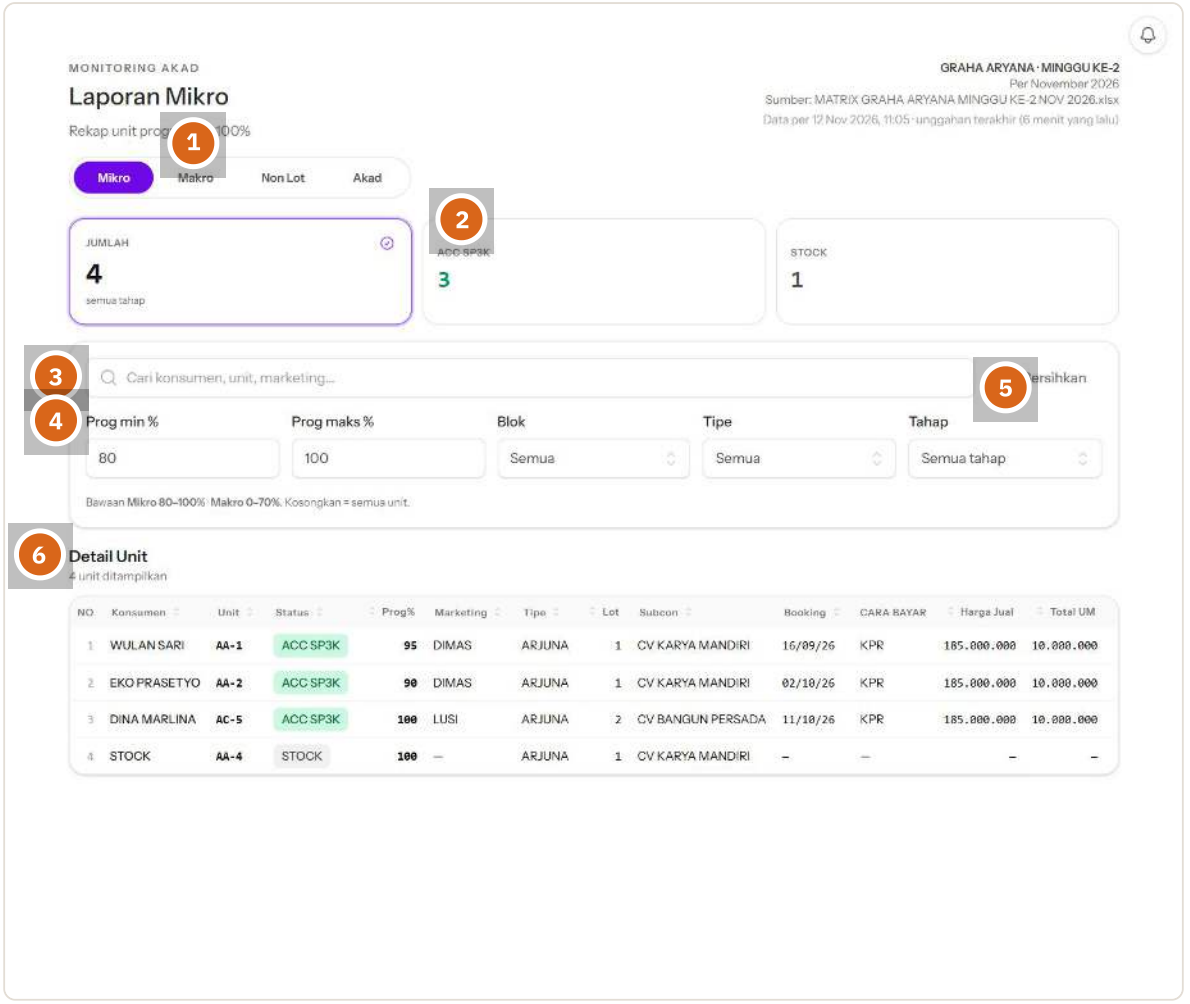


BAGIAN 7


Empat tab laporan

TAB	ISI
Mikro	Unit dengan progres **80–100%**: yang paling dekat ke akad. Tahapnya antara lain ACC SP3K dan Stock (unit tanpa pembeli).
Makro	Unit dengan progres **0–70%**. Tahapnya antara lain Proses Bank dan Berkas Belum.
Non Lot	Unit yang belum masuk pengajuan LOT. Kolomnya sedikit berbeda: ada BBA dan UM masuk.
Akad	Unit yang akadnya sudah selesai.

- Mikro dan Makro membaca daftar unit yang sama; bedanya hanya rentang progres awalnya. Unit dengan progres 71–79% tidak masuk rentang awal keduanya. Kosongkan Prog min dan maks untuk melihatnya.
- Laporan selalu memakai **unggahan terakhir**. Lihat keterangan *Data per* di kanan atas untuk memastikan datanya minggu ini.

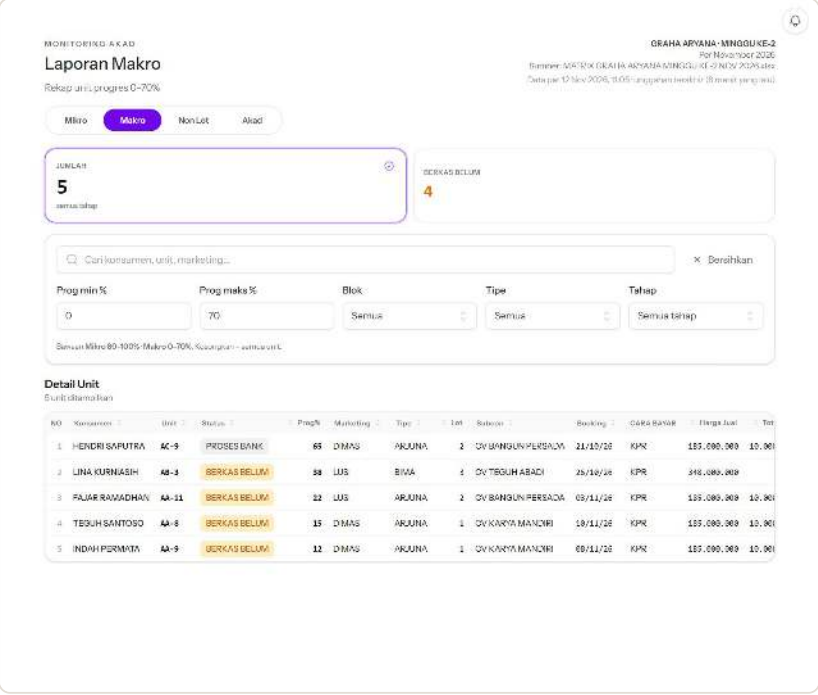

Tab Makro: tahap Proses Bank dan Berkas Belum.

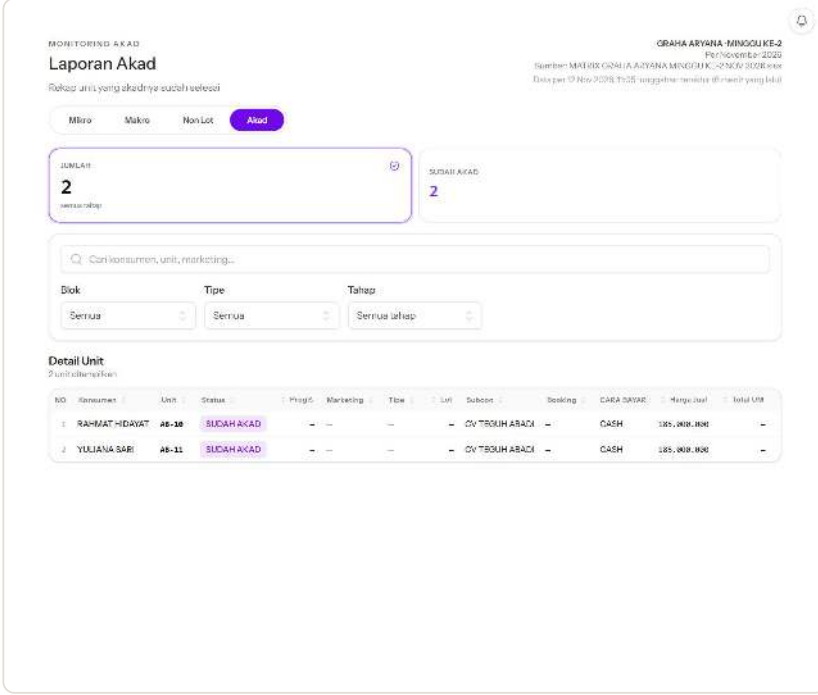


Tab Akad: unit yang sudah akad.

Unggah Matrix

Menu **Matrix › Unggah**, setiap minggu setelah Admin KPR menyerahkan berkas Matrix.

1. Pilih berkas XLSX, maksimal 20 MB. Berkas dari Admin KPR bisa diunggah apa adanya; yang dibaca hanya sheet MIKRO, MAKRO A, MAKRO B, NON LOT, dan SUDAH AKAD.
2. **Minggu laporan** otomatis minggu berjalan. Ganti bila mengunggah berkas minggu lain.
3. **Sekalian perbarui data teknik**: progres, LOT, dan subcon di Data Rumah disamakan dengan berkas. Kolom yang kosong di berkas tidak mengubah apa pun. Subcon yang belum terdaftar ditambahkan ke master subcon.
4. **Sekalian perbarui pemberkasan**: tanggal BM, WCR, SP3K, LPA, Rencana Akad, dan kode bank diisikan ke Pemberkasan KPR, hanya ke kolom yang masih kosong.
5. **Unggah**. Pesan hasilnya menyebut jumlah unit yang terbaca dan yang diperbarui.

> Pilihan nomor 3 menimpa progres yang dicatat Admin Teknik dengan angka di berkas. Nyalakan hanya bila berkas Matrix minggu itu sudah dicocokkan dengan lapangan.

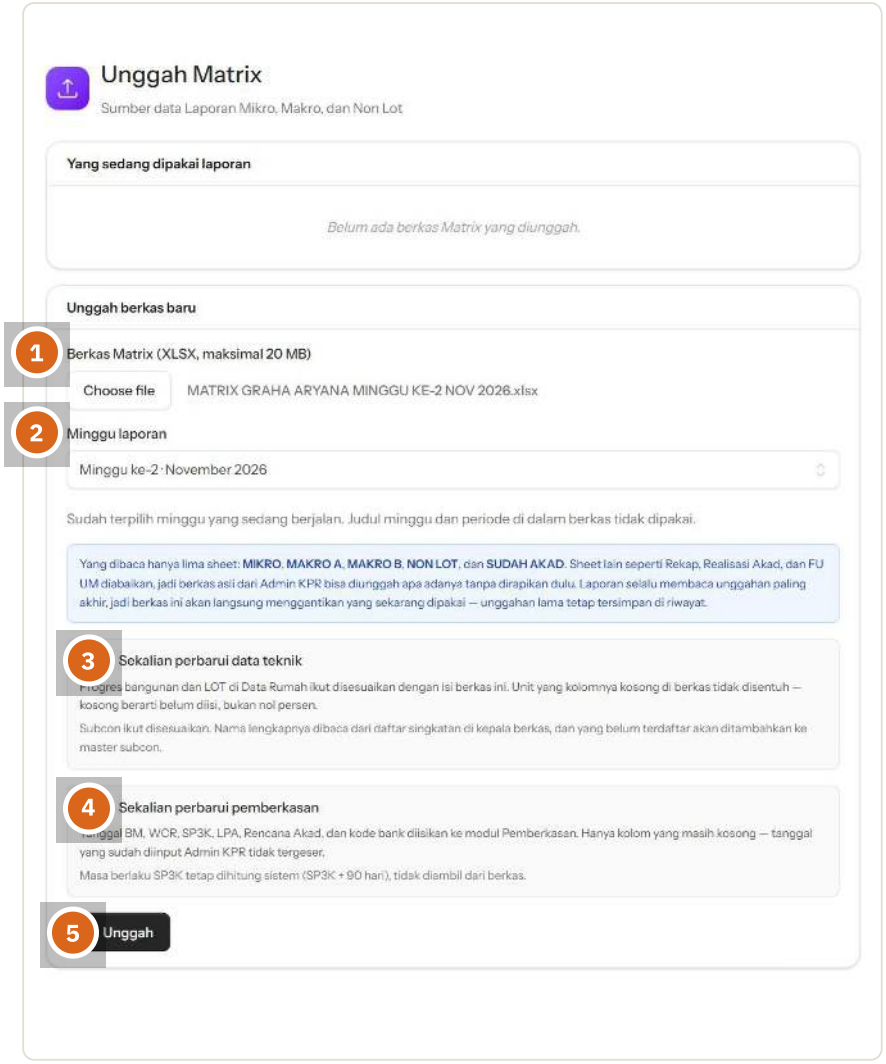


Setelah diunggah

Yang sedang dipakai laporan menampilkan proyek, minggu, periode, total unit, dan jumlah unit per bagian (Mikro, Makro A, Makro B, Non Lot, Sudah Akad). Cocokkan angkanya dengan berkas.

Riwayat unggahan menampilkan sepuluh unggahan terakhir:

1. Label Dipakai laporan menandai unggahan yang sedang dibaca laporan.
2. **Hapus** membuang unggahan yang salah beserta seluruh baris unitnya. Bila yang dihapus unggahan terakhir, laporan kembali memakai unggahan sebelumnya.

> Menghapus unggahan tidak mengembalikan progres di Data Rumah atau tanggal di Pemberkasan yang sudah terisi dari unggahan itu.

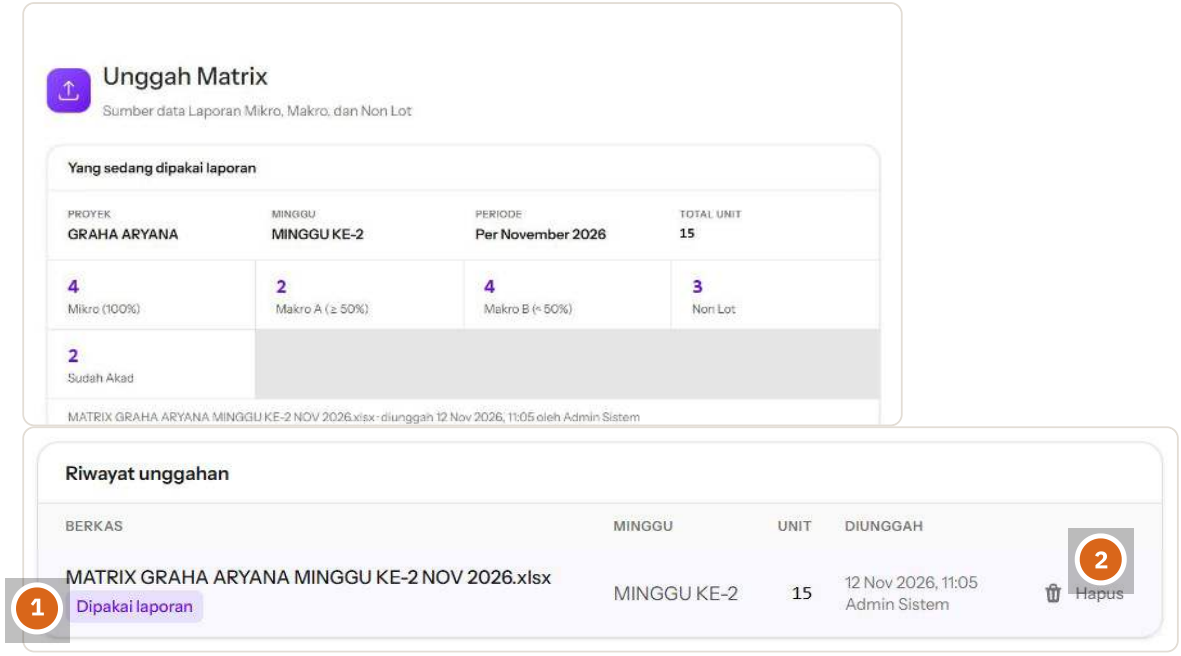

BAGIAN 9

Tanya jawab

Tombol Update tidak muncul?

Hanya Admin Teknik yang bisa mengubah progres. Peran lain hanya melihat.

Progres yang saya isi berubah sendiri?

Admin Sistem mengunggah Matrix dengan pilihan *Sekalian perbarui data teknik*, sehingga progres disamakan dengan berkas. Kolom Update Terakhir menunjukkan waktu dan nama pengunggahnya. Perubahan dari unggahan tidak masuk Riwayat Progres.

Salah mengisi progres?

Klik Update lagi dan isi angka yang benar dengan catatan alasannya. Kedua perubahan tetap tercatat di riwayat.

Menu Matrix tidak ada di sidebar?

Laporan Matrix dibaca Direktur, Project Manager, Admin KPR, Admin Sales, dan FAT (Keuangan). Admin Teknik mencatat progres lewat Data Rumah.

Unit tidak muncul di Mikro maupun Makro?

Progresnya di antara 71 dan 79%. Kosongkan Prog min dan maks, atau cari nama konsumennya.

Laporan masih menampilkan minggu lalu?

Berkas minggu ini belum diunggah. Hubungi Admin Sistem.
